

Baubetriebliche Monatsübersicht

Zeitraum 01.09.22 bis 30.09.22

Leistungen / Auszuführende Arbeiten / Beeinträchtigungen


Fertigstellung Obere Drainage Bauteil 2.
Fertigstellung Bodenbeschichtung Bauteil 2.
Vorbereitungen Aufbau Reinraumwände Bauteil 2.

Fertigstellung Dämm- und Abdichtungsarbeiten Dach.
Fertigstellung Fassage (Pfosten + Riegel) OG.
Ausführung Fassade 1. UG.
Fertigstellung Beschichtungsarbeiten Bauteil 1 / UG.
Ausführung Beschichtungsarbeiten Bauteil 1 / DG.
Ausführung Trockenbau Bauteil 1 (EG / OG).
Unterkonstruktionen Schlosser: Fluchttreppen und Rankgerüst (DG).
Anlieferung Foyertreppe.

Fertigstellung Überdeckung Bauteil 2.
Vorbereitungen Richtfest.

Sperrung des südlichen Bereichs (ab Kreuzung Chemie) der "Tiefstraße Ost" für Kanalanschlussarbeiten und Abdichtung des Medienkanals von 05.09. - 16.09.
Weitere tageweise Sperrungen der "Tiefstraße Ost" sind möglich und werden gesondert bekannt gegeben. Eine Umfahrung des gesperrten Bereichs über "Am Biopark" ist jederzeit möglich.

Trotz regelmäßiger Straßenreinigung ist mit einem erhöhten Verschmutzungsgrad der "Tiefstraße Ost" und "Am Biopark" zu rechnen.

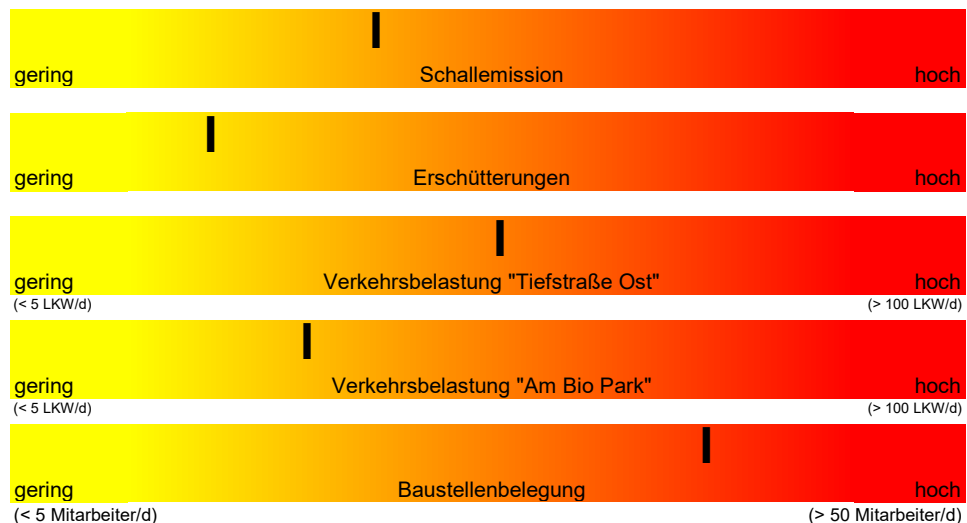

Alle Angaben zu Art, Umfang und Dauer der Bautätigkeiten sind als grobe Richtwerte anzunehmen und können je nach Baufortschritt und baulichen sowie witterungsbedingten Erfordernissen, Änderungen und Anpassungen unterworfen sein!
